

حزمة العمل 8 : المراقبة والتقييم

إعداد : فيليب هوسير و دانييل سكوبهيرت

جدول الأعمال

•الأهداف

•النتائج

•الجدول الزمني والحدث الرئيسي

الأهداف

□ رصد وتقييم الجودة:

هو جزء حاسم في مشاريع الاتحاد الأوروبي (القانوني والتمويل، وإثبات فعالية)

□ تحديد معايير تقييم التعليم في جميع الجامعات المشاركة

□ يزود إدارة المشروع والشركاء بالمعلومات

□ تحديد المشاكل المحتملة والتغلب عليها خلال المشروع

النتائج الرئيسية

المراقبة وخطة ضمان الجودة

تقرير التقييم

- المسؤول:
خارجي
مراجع
- في الوسط والنهية
من عمر المشروع الكلي

تقرير الجودة

- المسؤول:
لجنة الجودة
- تركيز خاص على
الأنشطة التعليمية
- نهاية كل فصل
تدريبي
(يجب أن توضح)

تقرير الرصد

- المسؤول:
لجنة الجودة
- سير العملية الإجمالية
للمشروع
- مرة واحدة في السنة
(لكل عام من المشروع)



لجنة الجودة : TUD, TU , UJ


الجدول الزمني والمراحل الرئيسية

نتائج	أنشطة	الشركاء	تاريخ التسليم
لجنة الجودة - D8.1			
لقاء	الاجتماع التمهيدي	TU, UJ, TUD	01/2016
لقاء	التقييم وإعداد التقرير السنوي	TU, UJ, TUD	نهاية المشروع السنة 1
لقاء	التقييم وإعداد التقرير السنوي	TU, UJ, TUD	نهاية المشروع السنة 2
لقاء	التقييم وإعداد التقرير السنوي	TU, UJ, TUD	نهاية المشروع السنة 3
الرصد وخطة ضمان الجودة - D8.2			
	المراحل الرئيسية وتقييم المخاطر لحزمة العمل الخاصة	جميع حزم العمل القياديون	15/02/2016
خطة التقييم	تطوير خطة التقييم	TU, UJ, TUD	31/03/2016

الجدول الزمني والحدث الرئيسي

تاريخ التسليم	الشركاء	أنشطة	نتائج
	الرصد وتقرير التقييم - D8.3		
نهاية المشروع السنة 1	جميع الشركاء	تقرير مؤشرات الأداء وبلوغ الإنجازات	
نهاية المشروع السنة 1	TU, UJ, TUD	تقييم المراحل لكل مجموعة عمل وتقييم مؤشرات الأداء	تقرير الرصد تقرير الجودة
نهاية المشروع السنة 2	جميع الشركاء	تقرير مؤشرات الأداء وبلوغ الإنجازات	
نهاية المشروع السنة 2	TU, UJ, TUD	تقييم المراحل لكل مجموعة عمل تقييم التدريس (استبيان) وتقييم مؤشرات الأداء	تقرير الرصد تقرير الجودة
نهاية المشروع السنة 3	جميع الشركاء	تقرير مؤشرات الأداء وبلوغ الإنجازات	
نهاية المشروع السنة 3	TU, UJ, TUD	تقييم المراحل لكل مجموعة عمل تقييم التدريس (استبيان) وتقييم مؤشرات الأداء	تقرير الرصد تقرير الجودة
	التقييم الخارجي - D8.4		
نهاية المشروع السنة 1	TU, UJ, TUD	اختيار التقييم الخارجي	
منتصف المشروع	التقييم الخارجي	مراجعة خارجية للجودة وتقييم الوضع الحالي للمشروع	التقرير
نهاية المشروع	التقييم الخارجي	مراجعة خارجية للجودة وتقييم الوضع الحالي للمشروع	التقرير

الجدول الزمني والحدث الرئيسي

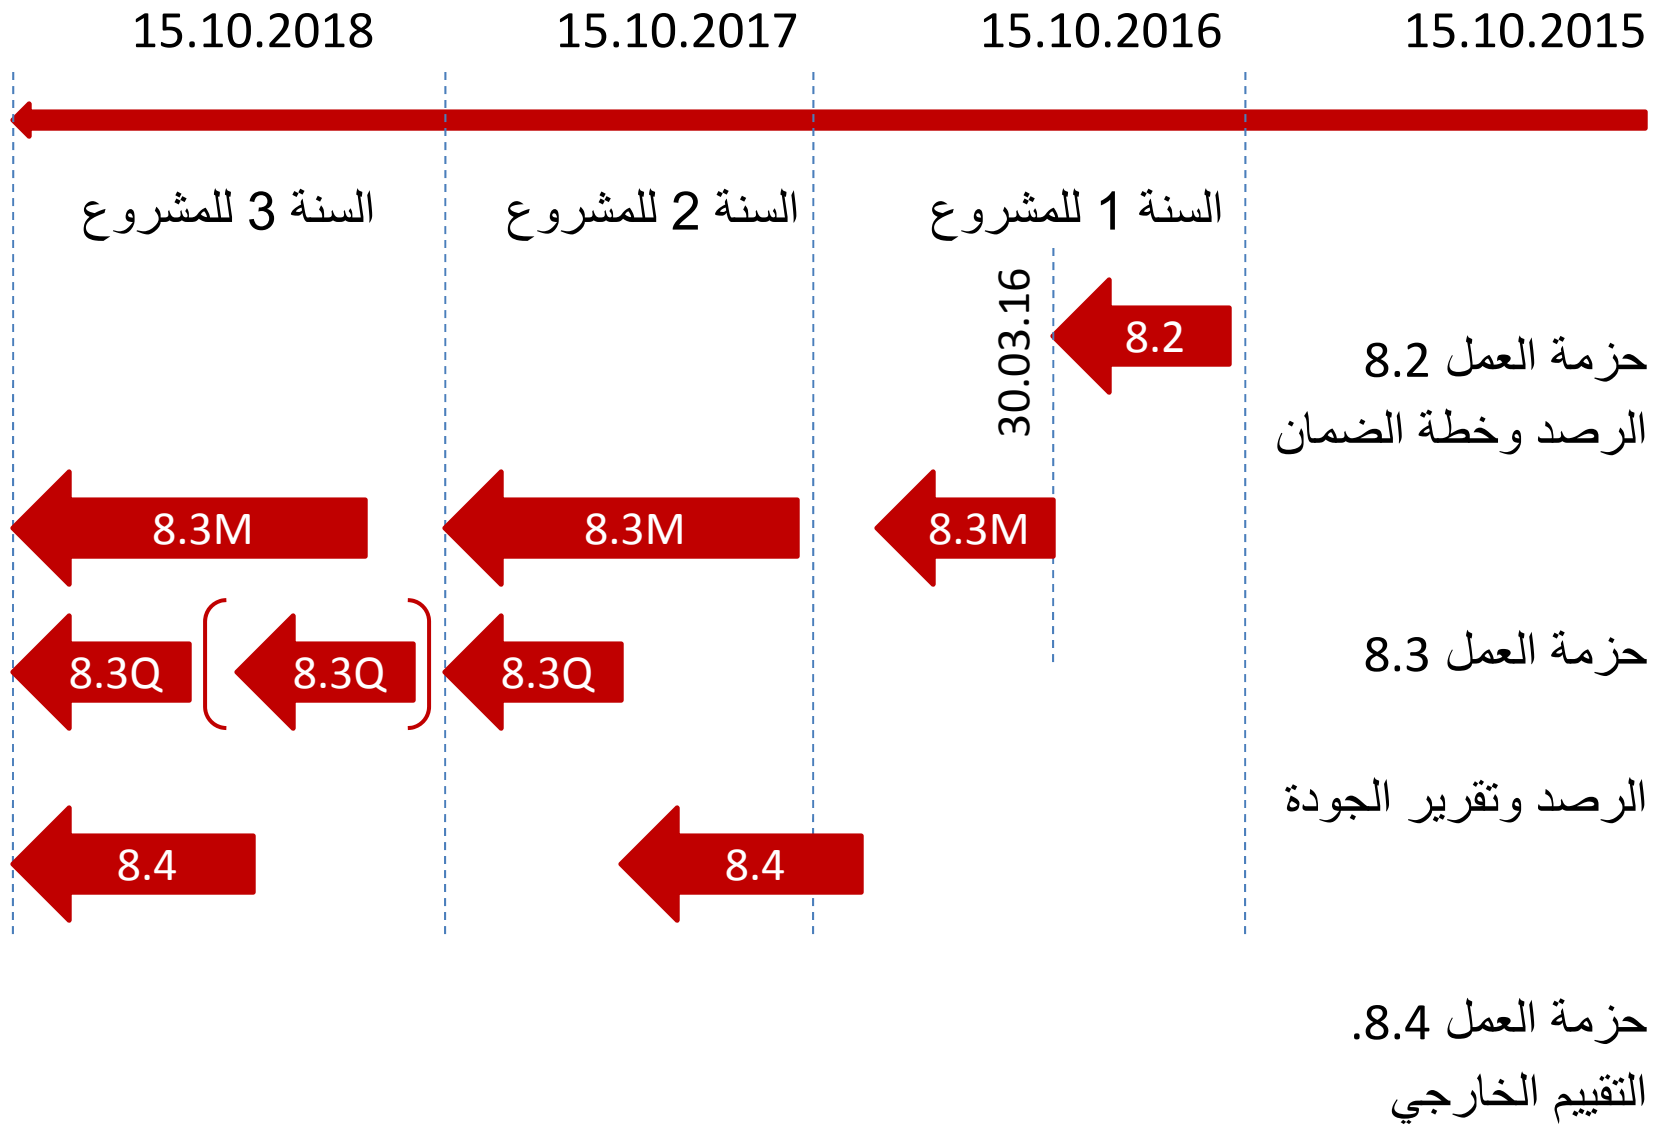

الرصد وخطة التأمين

المحتوى :

- تحديد الجدول الزمني
- تحديد الأدوات مثل: SWOT، مصفوفة المخاطر
- تحديد المعايير
- المدخلات المطلوبة من الشركاء
- خبرة الشركاء (أمثلة؟)
- المراحل والمواعيد القصوى لجميع حزم العمل
- تقييم اليوم وأنظمة القياس للجامعات الشريكة

الموعد النهائي
15/02/2016

أسئلة ومناقشة

Wissen Schafft Brücken

Daniel Schubert
daniel.schubert@tu-dresden.de

Philipp Hauser
philipp.hauser@tu-dresden.de

Technische Universität Dresden
Chair of Energy Economics
Prof. Dominik Möst
www.ee2.biz
